

## 1. 委託期間

契約締結の日から令和6年1月31日まで

## 2. 業務内容

### I. 施設・運動場の適正規模の検証

- (1) 必要施設の洗い出し
- (2) 必要諸室の洗い出し
- (3) 上記に適正な広さを与えることにより施設規模の割り出し

### II. 現況・周辺状況の調査

- (1) 各校敷地内の現況状況の調査
- (2) 各校周辺の環境状況の調査

### III. 敷地の適正比較


- (1) 城東中学校における建物適正配置計画
  - a. 現行の建物用地・運動場用地区分を生かす配置案
  - b. 現行の建物を工事中も極力利用可能な配置案
  - c. 各配置案の法適合性の確認
  - d. 各配置案の仮設施設の必要性の検討
  - e. 急傾斜地としての対策の検討
  - f. 宅内雨水処理対策の検討
  - g. 運動場砂埃対策の検討
  - h. 日影の周辺への影響確認
- (2) 佐野小学校における建物適正配置計画
  - a. 現行の建物用地・運動場用地区分を生かす配置案
  - b. 現行の建物を工事中も極力利用可能な配置案
  - c. 各配置案の法適合性の確認
  - d. 各配置案の仮設施設の必要性の検討
  - e. 日影の周辺への影響確認
- (3) 天明小学校における建物適正配置計画
  - a. 現行の建物用地・運動場用地区分を生かす配置案
  - b. 現行の建物を工事中も極力利用可能な配置案
  - c. 各配置案の法適合性の確認
  - d. 各配置案の仮設施設の必要性の検討
  - e. 日影の周辺への影響確認
- (4) 上記3校における配置計画案の比較検証

### IV. 成果品とりまとめ




# 佐野市立城東中学校区小中一貫校整備事業基礎調査業務委託 位置図






佐野小学校  
配置図

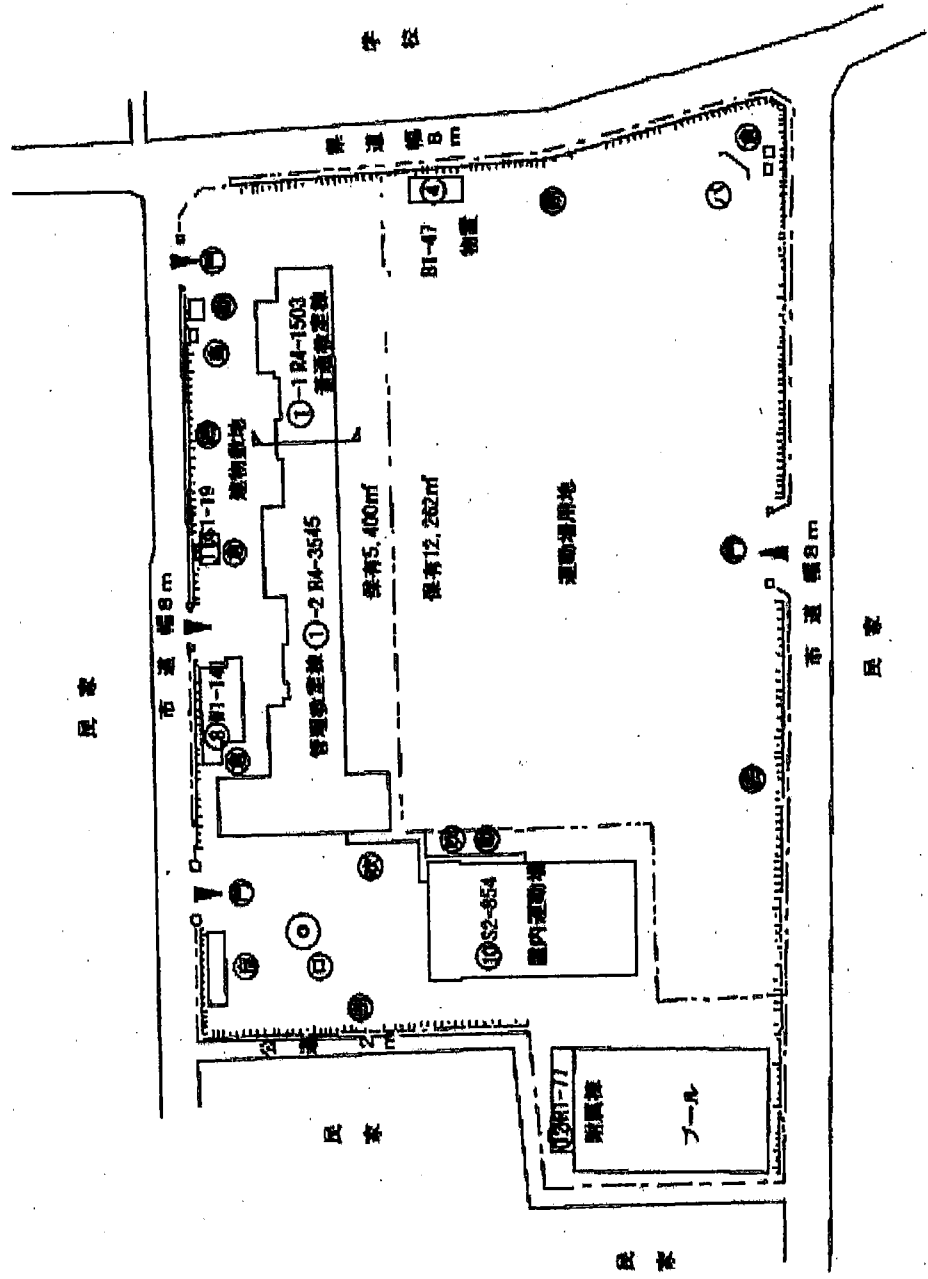

# 天明小学校 配置図

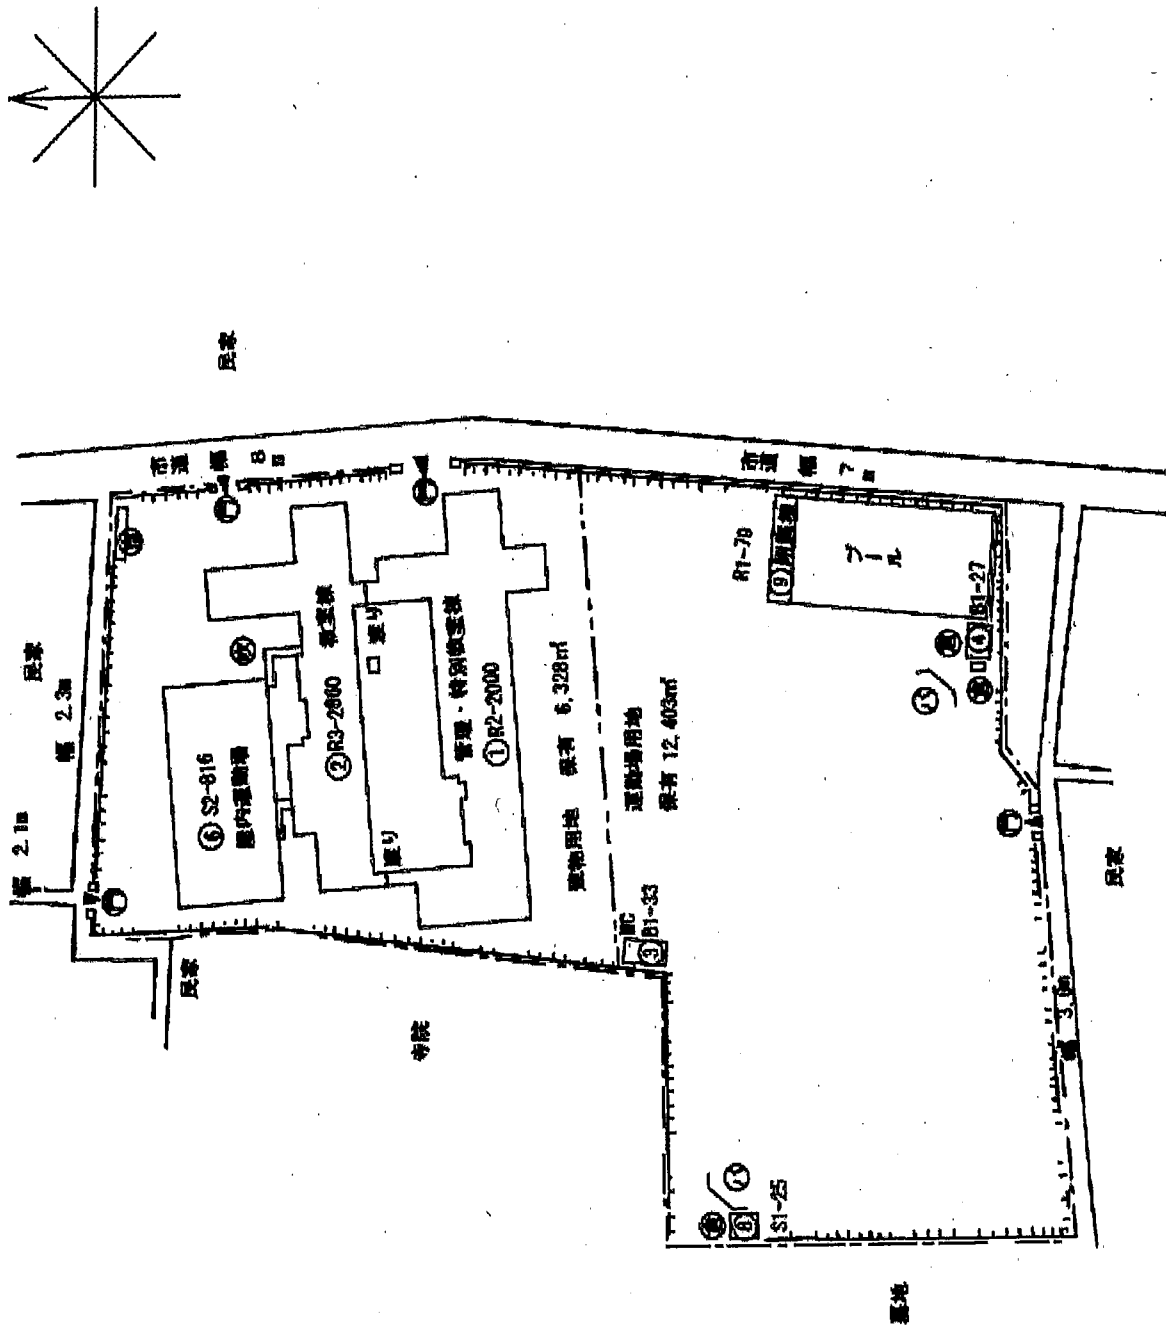

# 城東中学校 配置図

